別紙資料３

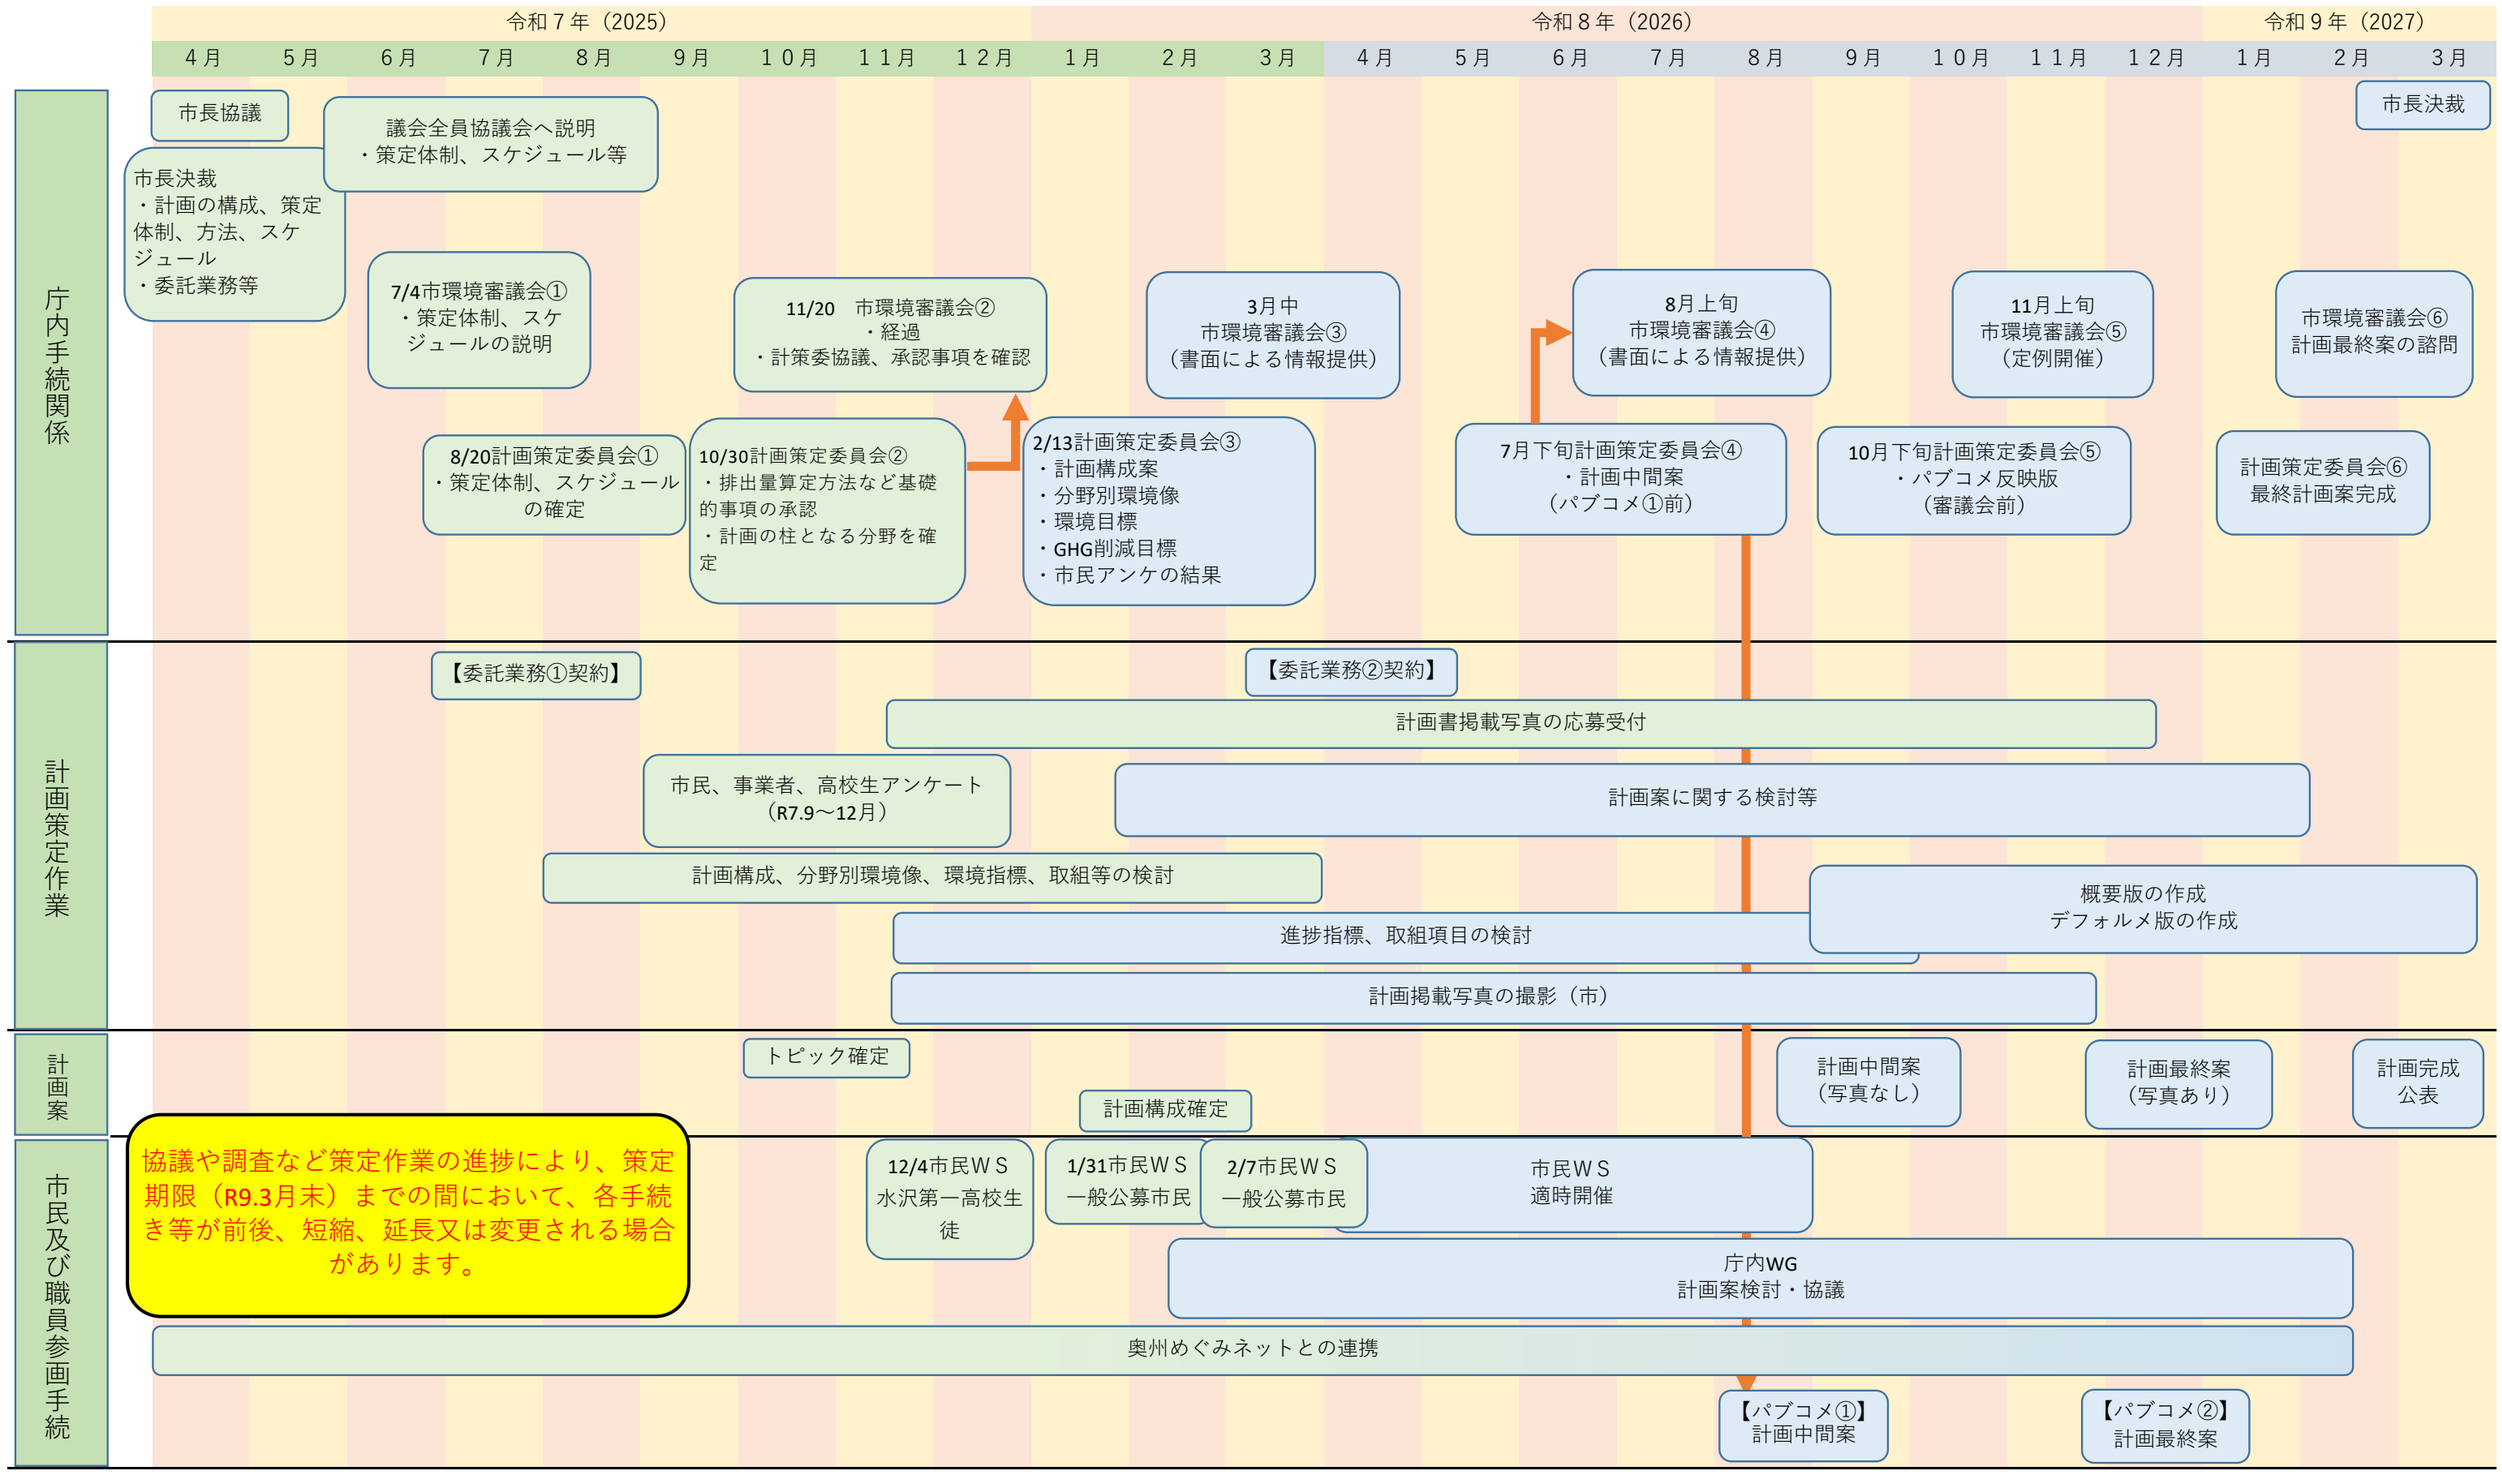
令和７年（2025）
令和８年（2026）
令和９年（2027）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
庁内手続関係
市長協議
市長決裁
・計画の構成、策定体制、方法、スケジュール
・委託業務等
議会全員協議会へ説明
・策定体制、スケジュール等
7/4市環境審議会①
・策定体制、スケジュールの説明
8/20計画策定委員会①
・策定体制、スケジュールの確定
10/30計画策定委員会②
・排出量算定方法など基礎的事項の承認
・計画の柱となる分野を確定
11/20　市環境審議会②
・経過
・計策委協議、承認事項を確認
2/13計画策定委員会③
・計画構成案
・分野別環境像
・環境目標
・GHG削減目標
・市民アンケの結果
3月中
市環境審議会③
（書面による情報提供）
7月下旬計画策定委員会④
・計画中間案
（パブコメ①前）
8月上旬
市環境審議会④
（書面による情報提供）
10月下旬計画策定委員会⑤
・パブコメ反映版
（審議会前）
11月上旬
市環境審議会⑤
（定例開催）
計画策定委員会⑥
最終計画案完成
市環境審議会⑥
計画最終案の諮問
市長決裁
計画策定作業
【委託業務①契約】
【委託業務②契約】
計画書掲載写真の応募受付
市民、事業者、高校生アンケート
（R7.9～12月）
計画案に関する検討等
計画構成、分野別環境像、環境指標、取組等の検討
概要版の作成
デフォルメ版の作成
進捗指標、取組項目の検討
計画掲載写真の撮影（市）
計画案
トピック確定
計画構成確定
計画中間案
（写真なし）
計画最終案
（写真あり）
計画完成
公表
市民及び職員参画手続
協議や調査など策定作業の進捗により、策定期限（R9.3月末）までの間において、各手続き等が前後、短縮、延長又は変更される場合があります。
12/4市民ＷＳ
水沢第一高校生徒
1/31市民ＷＳ
一般公募市民
2/7市民ＷＳ
一般公募市民
市民ＷＳ
適時開催
庁内WG
計画案検討・協議
奥州めぐみネットとの連携
【パブコメ①】
計画中間案
【パブコメ②】
計画最終案
